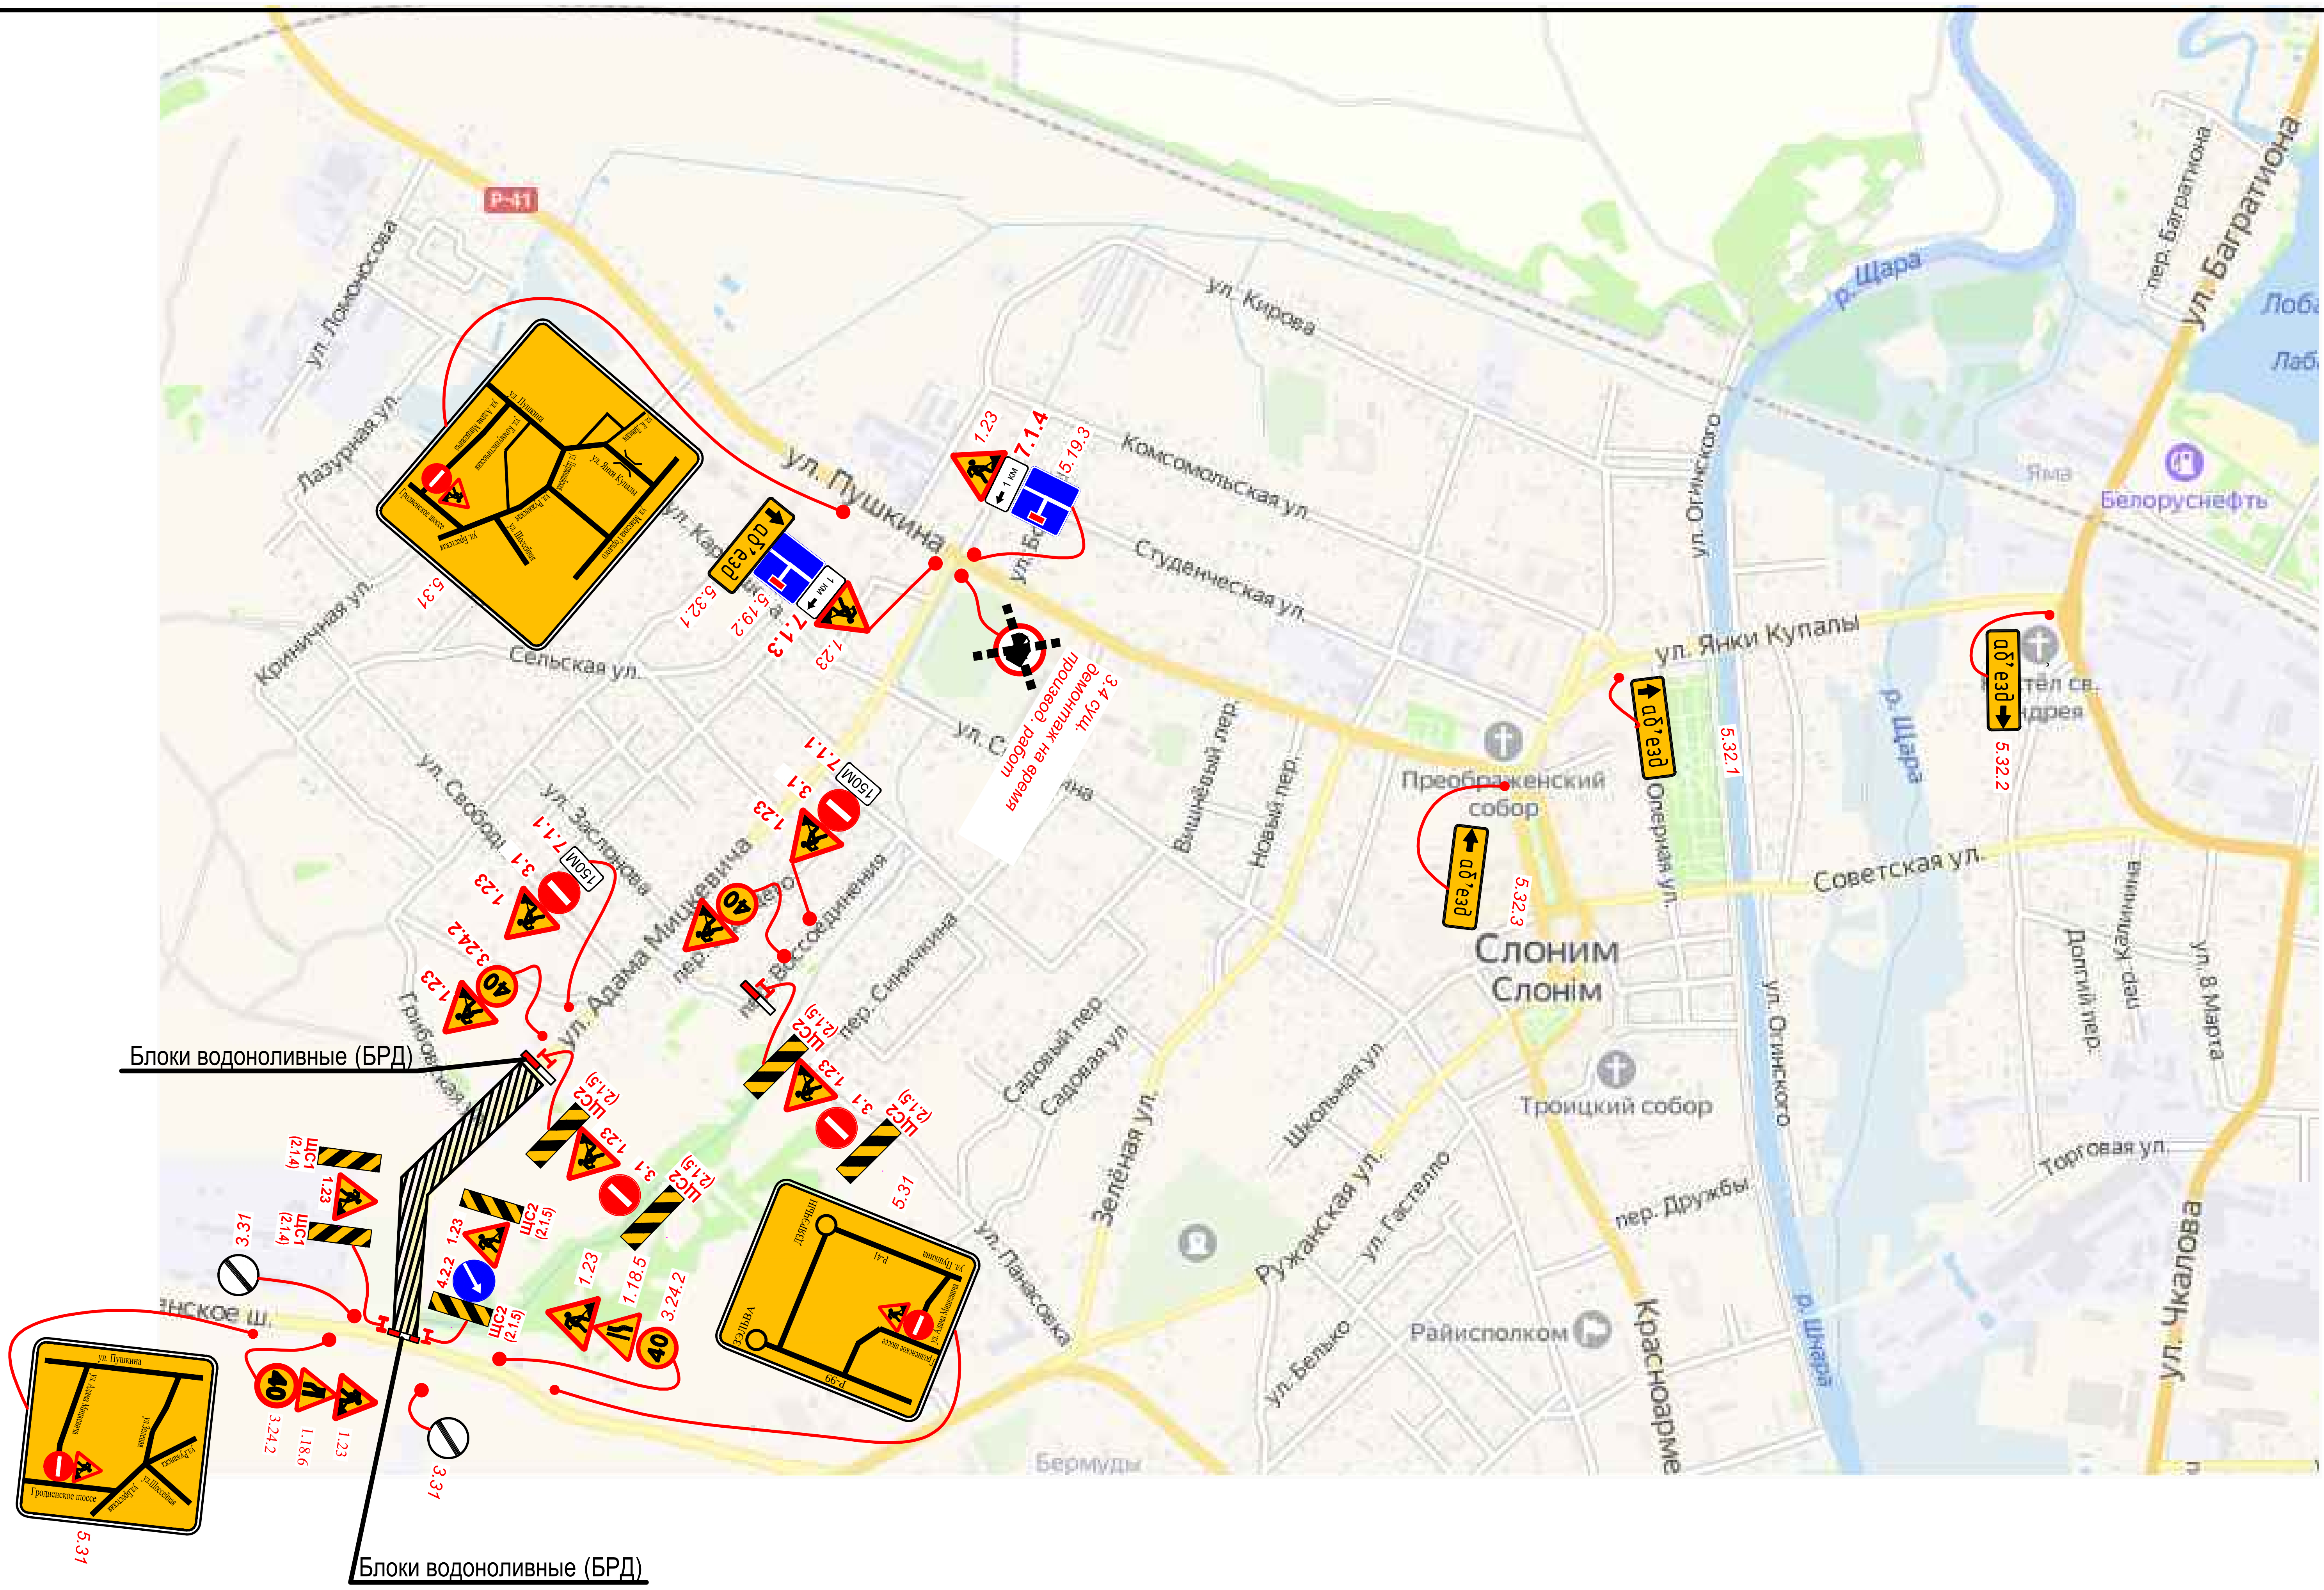

Ведомость временных технических средств организации дорожного движения (ТСООД) ул. Адама Мицкевича

Наименование ТСОДД	Типоразмер	Кол-во установок				Кол-во демонтажей				Примечание
		Всего	Отдельно на стойке	Дополнительно на стойке	На ограждении	Всего	Отдельно на стойке	Дополнительно на стойке	На ограждении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.23 Дорожные работы	II	9	6		3	9	6		3	
1.18.5 Сужение дороги	II	1		1		1		1		
1.18.6 Сужение дороги	II	1		1		1		1		
3.1 Въезд запрещен	II	2		1	1	1		1	1	
3.24.2 Ограничение максимальной скорости	II	3		3		3		3		
3.31 Конец всех ограничений	II	2	2			2	2			
4.2.1 Объезд препядствия спарва	II	1			1	1			1	
4.2.2 Объезд препядствия слева	II	1			1	1			1	
5.19.2 Тупик	II	1		1		1		1		
5.19.3 Тупик	II	1		1		1		1		
5.31 Схема объезда	2000x 2000	5	5			5	5			на 2-ух стойках
5.32.1 Направление объезда	II	3	3			3	3			
5.32.2 Направление объезда	II	3	3			3	3			
5.32.3 Направление объезда	II	3	3			3	3			
7.1.1 Расстояние до объекта	II	1		1		1		1		
7.1.3 Расстояние до объекта	II	1		1		1		1		
7.1.4 Расстояние до объекта	II	1		1		1		1		
Щиток с вертикальной разметкой 2.1.4 (ЩС1)	100* 700	2			2	2			2	
Щиток с вертикальной разметкой 2.1.5 (ЩС2)	100* 700	4			4	4			4	
Всего дорожных знаков		45	22	11	12	45	22	11	12	
Панельно-стояночное ограждение		3				3				
Блоки водоноливные (БРД-1.2м)		46				46				шт.
Стойка дорожных знаков L -2.80м (1 знак (II т.р.))		10				10				дерев.
Стойка дорожных знаков L -4.20 м (1 знак 5.31)		10				10				дерев.
Стойка дорожных знаков L -3.25м (2 знак (II т.р.))		1				1				дерев.
Стойка дорожных знаков L -3.85м (3 знак (II т.р.))		5				5				дерев.
Всего стоек дорожных знаков		26				26				дерев.

Ведомость временных технических средств организации дорожного движения (ТСООД) ул. Проектируемоя №7

Наименование ТСОДД	Типоразмер	Кол-во установок				Кол-во демонтажей				Примечание
		Всего	Отдельно на стойке	Дополнительно на стойке	На ограждении	Всего	Отдельно на стойке	Дополнительно на стойке	На ограждении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.23 Дорожные работы	II	3	2		1	3	2		1	
3.1 Въезд запрещен	II	2		1	1	1		1	1	
3.24.2 Ограничение максимальной скорости	II	1		1		1		1		
7.1.1 Расстояние до объекта	II	1		1		1		1		
Щиток с вертикальной разметкой 2.1.5 (ЩС2)	100* 700	2			2	2			2	
Всего дорожных знаков		9	2	3	4	9	2	3	4	
Панельно-стояночное ограждение		1				1				
Блоки водоноливные (БРД-1.2м)		6				6				шт.
Стойка дорожных знаков L -3.25м (2 знак (II т.р.))		1				1				дерев.
Стойка дорожных знаков L -3.85м (3 знак (II т.р.))		1				1				дерев.
Всего стоек дорожных знаков		2				2				дерев.

1. Сущ. дорожный знак 3.4 на время производства работ закрыть темным, не прозрачным материалом.
2. Схема организации дорожного движения на время проведения работ выполнена согласно ТКП 636-2019

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	133.19-00-ГП
						Квартал индивидуальной жилой застройки по ул. Мицкевича в г. Слониме
ГИП	Фисенко					1 пусковой комплекс
Утвердил	Мазничка					Стадия / Лист / Листов
Проверил	Заломай					Схема организации дорожного движения на время проведения работ (окончание)
Разработал	Заломай					УП "Институт Гродногражданпроект"
Н.контроль	Заломай					ПМ-2 2020г.

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N
